

PROJEKT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE NA OTOKU KRKU INVESTICIJSKI MODEL „B“ KK.02.1.1.01.0020

9. IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA – svibanj 2023. (od 15. veljače 2023. do 15. svibnja 2023.)

Sukladno članku 14. Sporazuma Grad Krk dostavljam osmo izvješće o napretku Projekta izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku. U sklopu ovog izvješća predočit će se informacije vezane uz:



- napredak pojedinih aktivnosti i
- financija.

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U periodu od 15. veljače 2023. do 15. svibnja 2023. odrađene su sljedeće aktivnosti:

- Izrađena je sva potrebna projektna dokumentacija za trase svjetlovodne mreže;
- Izvode se radovi na području svih JLS-ova na otoku;
- Izvode se pripremni radovi za postavljanje kolokacijskog čvora (POP) u Dobrinju;
- SIK je uplatio potreban iznos po ponudi HEP ODS-a, kako bi HEP ODS pokrenuo proceduru i radove na izgradnji strujnog priključka do lokacije PoP-a Dobrinj.
- Od ŽUC-a su zatražene sve potrebne suglasnosti za radove na županijskim cestama. Uskoro se očekuju prve suglasnosti;
- Provedba projekta koordinira se na redovitim koordinacijskim sastancima koji se održavaju u pravilu svaki 14 dana. Na sastancima prisustvuju predstavnici izvođača, nadzora, trgovačkog društva „SIK d.o.o.“, konzultanata i Grada Krka. U ovom periodu odrađeno je 8 sastanaka;
- Pokrenuti su preostali planirani postupci nabave vezani uz obvezne aktivnosti na promicanju horizontalnih načela (terenski obilazak pojedinaca i predstavnika civilnog društva, i edukacije za korištenje interneta i povećanje informatičke pismenosti)
- Pripremljen je prijedlog standardne ponude za veleprodajne naknade i uvjete operatora te poslan u HAKOM na neformalnu kontrolu;
- Prikupljaju se suglasnosti potencijalnih korisnika svjetlovodne mreže koja se gradi. Do sad je prikupljeno 1.196 suglasnosti;
- Konstantno se kontaktira s potencijalnim korisnicima telekomunikacijskih usluga putem planirane infrastrukture;
- Održava se web stranica projekta u koordinaciji s tvrtkom NetCom d.o.o.;
- Web stranica projekta se redovito ažurira s tjednim najavama radova i vijestima;
- Šalju se mjesečni izvještaji o provedbi projekta prema Gradonačelniku Grada Krka;
- Povremeno se obilaze gradilišta sa strane predstavnika Grada Krka kako bi se stekao uvid o stanju radova na terenu;
- Dogovoreno je da će se prvi informativni događaj (konferencije za medije), u sklopu aktivnosti informiranja i vidljivosti, održati 1. lipnja 2023..

Prikaz realizacije pokrivenosti adresa:

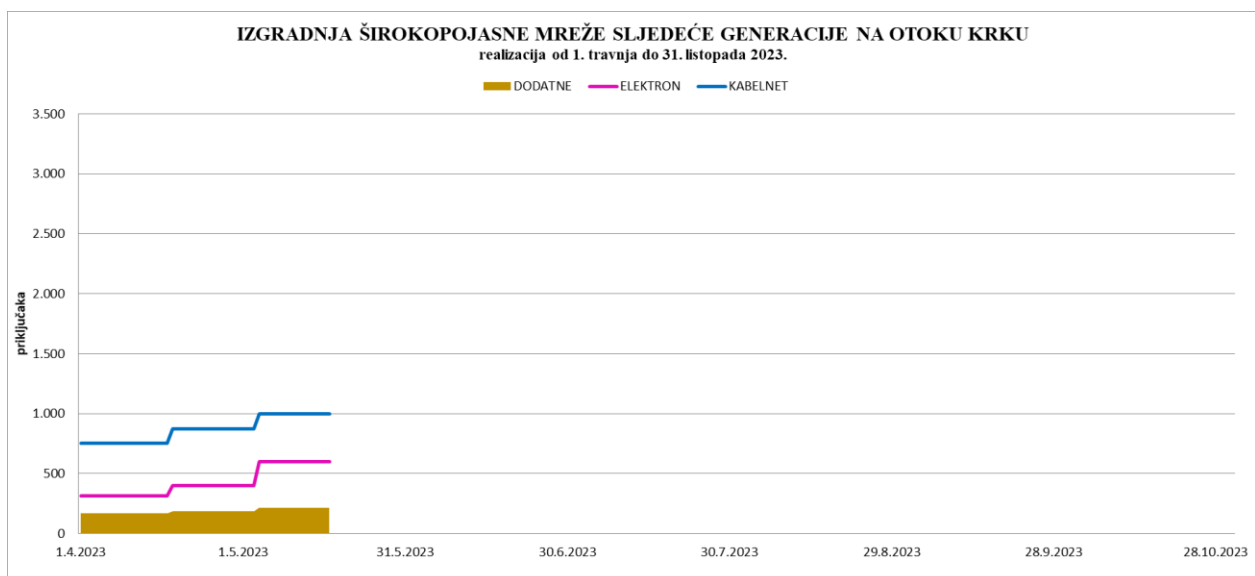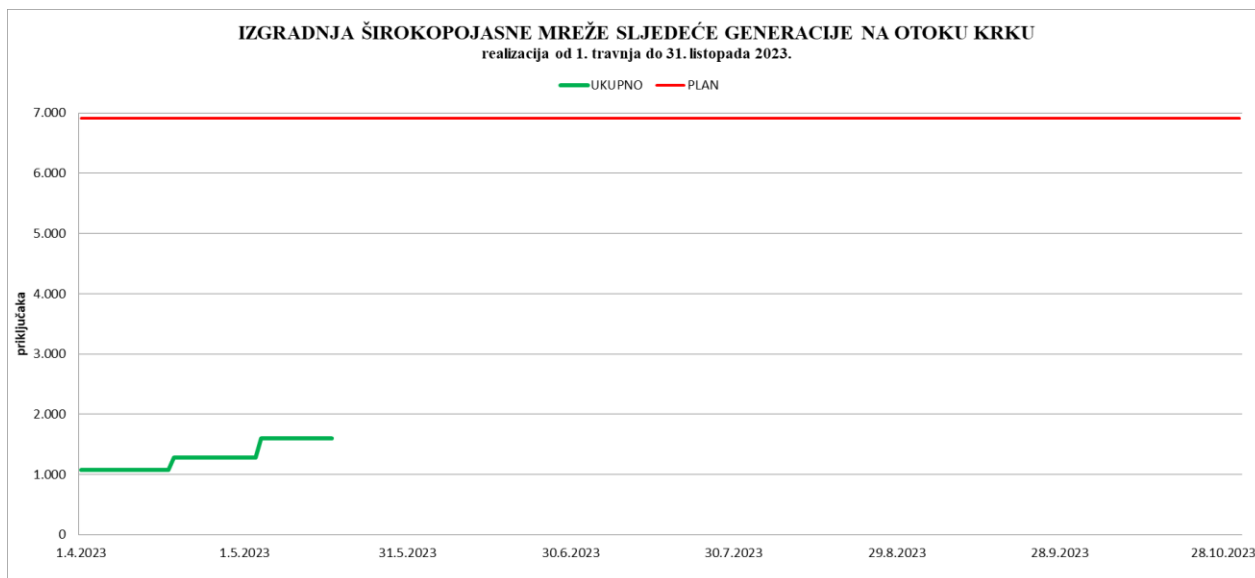

GOTOVO	1.596	23,08%	DODATNE ADRESE
izvođač - ELEKTRON	600	17,25%	26
izvođač - KABELNET	996	29,05%	187
	1.596		213

Rb.	Naziv DČ	Broj adresa	REALIZIRANO	GOTOVO		NAPREDAK	DODATNE ADRESE
				KABELNET	ELEKTRON		
	izvođač - ELEKTRON						
	izvođač - KABELNET						
	GRAD KRK	1191	249	213	36	20,91%	76
1	Kornić	213	213	213	0	100,00%	76
2	Krk - Linardići	181	0	0	0	0,00%	0
3	Ponikve	47	36	0	36	76,60%	0
4	Krk - Nenadići	202	0	0	0	0,00%	0
5	Krk - Salatići	266	0	0	0	0,00%	0
6	Krk - Skbrčići	191	0	0	0	0,00%	0
7	Krk - Brzac	91	0	0	0	0,00%	0
	OPĆINA OMIŠALJ	555	186	0	186	33,51%	6
8	Omišalj Pušća	217	58	0	58	26,73%	4
9	Omišalj Mali Kjec	221	128	0	128	57,92%	2
10	Omišalj Večja	117	0	0	0	0,00%	0
	OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA	1529	378	0	378	24,72%	20
11	Kremenići	170	150	0	150	88,24%	20
12	Zidarići	149	50	0	50	33,56%	0
13	Vantačići	135	61	0	61	45,19%	0
14	Milčetić	339	0	0	0	0,00%	0
15	Sveti Anton	262	0	0	0	0,00%	0
16	Sveti Vid	291	49	0	49	16,84%	0
17	Porat	183	68	0	68	37,16%	0
	OPĆINA DOBRINJ	2047	265	265	0	12,95%	45
18	Dobrinj (naselje)	198	198	198	0	100,00%	18
19	Kras	65	57	57	0	87,69%	24
20	Gabonjin 5	208	0	0	0	0,00%	0
21	Tribulje	217	0	0	0	0,00%	0
22	Soline - Polje	413	10	10	0	2,42%	3
23	Šilo	108	0	0	0	0,00%	0
24	Gostinjac	91	0	0	0	0,00%	0
25	Klimno	243	0	0	0	0,00%	0
26	Hlapa	209	0	0	0	0,00%	0
27	Čičiđi	295	0	0	0	0,00%	0
	OPĆINA VRBNIK	513	63	63	0	12,28%	9
28	Vrbnik 3	83	43	43	0	51,81%	7
29	Risika	303	20	20	0	6,60%	2
30	Garica	127	0	0	0	0,00%	0
	OPĆINA PUNAT	324	123	123	0	37,96%	15
31	Punat	123	123	123	0	100,00%	15
32	Stara Baška	201	0	0	0	0,00%	0
	OPĆINA BAŠKA	756	332	332	0	43,92%	42
33	Baška Kralja Zvonimira	212	212	212	0	100,00%	36
34	Baška Zarak	147	120	120	0	81,63%	6
35	Jurandvor	236	0	0	0	0,00%	0
36	Batomalj	97	0	0	0	0,00%	0
37	Draga Baščanska	64	0	0	0	0,00%	0
	UKUPNO	6915	1.596	996	600	23,08%	213

Na temelju praćenja realizacije projekta do 4. svibnja 2023. godine može se konstatirati da su radovi u zaostatku u odnosu na dinamički plan.

Tvrtka Kabelnet – većinom unutar rokova po dinamičkog planu, uz izuzetak da nisu započeli predviđeni radovi na području DČ Šilo.

Tvrtka Elektron – većinom se kasni s radovima u odnosu na rokove završetka iz dinamičkog plana (DČ Ponikve, DČ Kremenići), trenutna dinamika napretka nedovoljna za planirane datume završetka radova na području DČ Omišalj Pušća i DČ Omišalj Mali Kijec), nisu započeli planirani radovi na područjima DČ Linardići, DČ Gabonjin i DČ Tribulje, radovi na području DČ Sveti Vid i DČ Porat započeli su i ispred su planiranih rokova.

O ovom potencijalnom problemu se više puta raspravljalo na koordinacijskim sastancima, upozoravalo izvođače usmeno i pismeno, te je o cijeloj situaciji oko realizacije projekta upoznat i Gradonačelnik Grada Krka na sastanku koji je održan 4. svibnja 2023.

Izvođači kažu da im je veliki problem osigurati dovoljan broj radnika na terenu, ali da je kašnjenje moguće nadoknaditi. Rukovodeći ljudi tvrtke Elektron obećali su da će dovesti na otok preko 100 novih radnika krajem svibnja, kad završe neke započete poslove u Zagrebu.

FINANCIJE

U tablici su navedeni osnovni financijski podaci u dosadašnjem tijeku projekta.

U jedanestom ZNS-u potraživani su nastali troškovi za aktivnosti:

- PM.1, PM.4 i PM.n – Troškovi osoba u projektom timu zaposlenih u Gradu Krku,
- A3.1 – Upravljanje projektom gradnje,
- A3.2 – Projektiranje i građenje širokopojasne mreže;
- A4.1 - Usluge stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže;
- PM.3 – Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom,
- PV.3 - Dizajn i izrada tiskanog materijala i naljepnica

Tablica ZNS

U slijedećoj tablici daje se najnovije viđenje plana potraživanja sredstava do kraja realizacije projekta (prema stanju na dan 15.05.2023. u €):

	Predujmovi	Predujmovi	Iznos ZNS-ova	Iznos ZNS-ova
pro.20	0,00 kn	0,00 €	72.847,63 kn	9.668,54 €
sij.21	0,00 kn	0,00 €	496.818,36 kn	65.939,13 €
tra.21	0,00 kn	0,00 €	36.321,05 kn	4.820,63 €
srp.21	0,00 kn	0,00 €	177.077,19 kn	23.502,18 €
lis.21	0,00 kn	0,00 €	277.732,24 kn	36.861,40 €
sij.22	0,00 kn	0,00 €	164.973,67 kn	21.895,77 €
tra.22	0,00 kn	0,00 €	176.404,75 kn	23.412,93 €
srp.22	0,00 kn	0,00 €	125.063,51 kn	16.598,78 €
ruj.22	2.061.328,60 kn	273.585,32 €	0,00 kn	0,00 €
lis.22	0,00 kn	0,00 €	299.708,77 kn	39.778,19 €
stu.22	0,00 kn	0,00 €	1.920.666,10 kn	254.916,20 €
ožu.23	0,00 kn	0,00 €	4.164.578,00 kn	552.734,49 €
tra.23	20.986.566,48 kn	2.785.396,04 €	0,00 kn	0,00 €
lip.23	0,00 kn	0,00 €	19.850.000,00 kn	2.634.547,75 €
ruj.23	0,00 kn	0,00 €	28.450.000,00 kn	3.775.963,90 €
stu.23	0,00 kn	0,00 €	21.148.459,41 kn	2.806.882,93 €

1	Ukupni prihvatljivi troškovi:	10.267.522,82	€
2	Ukupna bespovratna sredstva:	7.647.453,41	€
3	Ukupno potraživano sredstava:	1.521.430,63	€
4	Ukupni odobreni troškovi:	863.178,11	€
5	Ukupno odbijeno troškova:	0,00	€
6	Ukupno isplaćeno povrata:	3.209.955,85	€

Realizacija 3/1: 14,82 %

Realizacija 4/3: 56,73 %

Realizacija 6/2: 41,97 %

Tablica ZNS

ZNS	POTRAŽIVANO		ODOBRENO		IZUZETO	ODBIJENO	ISPLAĆENO		
	datum	€	datum	€	€	€	datum	€	
1	2.12.2020	72.380,07	4.1.2021	9.668,54	62.711,53	0,00	19.1.2021	7.201,32	
2	18.1.2021	65.939,13	17.2.2021	65.939,13	0,00	0,00	10.3.2021	49.112,76	
3	30.4.2021	4.820,63	26.5.2021	4.820,63	0,00	0,00	10.6.2021	3.590,50	
4	30.7.2021	23.502,18	30.8.2021	23.502,18	0,00	0,00	21.9.2021	17.504,89	
5	29.10.2021	36.861,40	12.11.2021	36.861,40	0,00	0,00	7.12.2021	27.455,10	
6	31.1.2022	21.895,77	9.2.2022	21.895,77	0,00	0,00	1.3.2022	16.308,40	
7	1.5.2022	23.412,93	20.5.2022	23.412,93	0,00	0,00	31.5.2022	17.438,42	
8	26.7.2022	16.598,78	11.8.2022	16.598,78	0,00	0,00	30.8.2022	12.363,10	
9							4.10.2022	273.585,32	Predujam bespovratnih sredstava
10	2.11.2022	362.625,84	2.12.2022	39.778,19	322.847,65	0,00			
11	13.12.2022	335.628,11	15.2.2023	254.916,20	80.711,92	0,00			
12	1.3.2023	557.765,78	4.4.2023	365.784,35	191.981,43	0,00			
13							10.5.2023	2.785.396,04	Predujam bespovratnih sredstava
14									
		1.521.430,63		863.178,11	658.252,53	0,00		3.209.955,85	

Najnovije/trenutno predviđanje dinamike osiguranja vlastitih sredstava:

		UKUPNO	UKUPNO 2020. REALIZIRANO	UKUPNO 2021. REALIZIRANO	UKUPNO 2022. REALIZIRANO	UKUPNO 2023. PLANIRANO
UKUPNO	€	2.620.069,41	12.467,42	11.334,02	424.712,99	2.171.554,99
Grad Krk	€	357.759,62	0,00	0,00	61.242,79	296.516,84
Općina Baška	€	310.172,66	0,00	0,00	53.096,65	257.076,01
Općina Dobrinj	€	699.656,92	0,00	0,00	119.770,19	579.886,73
Općina Malinska-Dubašnica	€	756.461,18	0,00	0,00	129.494,18	626.966,99
Općina Omišalj	€	237.077,38	12.467,42	11.334,02	16.782,46	196.493,48
Općina Punat	€	94.530,85	0,00	0,00	16.182,19	78.348,67
Općina Vrbnik	€	164.410,80	0,00	0,00	28.144,53	136.266,27

Za 2020., 2021. i 2022. godinu su prikazani realizirani iznosi.

Za 2023. godinu su iznosi iz tablice također iskomunicirani sa JLS-ovima za potrebe izrade proračuna za 2023. godinu.

Krk, 16. svibnja 2023.

Voditelj projekta:
Čedomir Miler v.r.
